



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2019/57/0557 del 17/07/2019

Oggetto: LLPP EDP 2016/002 PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA DI PIAZZALE BOSCHETTI. AGGIUDICAZIONE AL R.T.I. TRA ZARA METALMECCANICA SRL (MANDATARIA) E VERONESE IMPIANTI SPA (MANDANTE) PER COMPLESSIVI € 1.870.137,50 (CUP: H91B15000560004; CIG: 7607926325).

IL CAPO SETTORE AD INTERIM Lavori Pubblici

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. 541 dell'11/10/2016 con la quale è stato approvato il progetto definitivo denominato "Riqualificazione area di Piazzale Boschetti" anticipandone il finanziamento con fondi comunali;
- la deliberazione di G.C. n. 299 del 05/06/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto dell'importo complessivo di € 2.300.000,00, di cui € 1.900.000,00 per lavori, che rientra tra i progetti inseriti nel c.d. *Piano Periferie* finanziato con il contributo statale in base al dpcm 25 maggio 2016 e per il quale è stata sottoscritta la Convenzione tra Comune di Padova e Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al Decreto di approvazione, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2018;

CONSIDERATO che, successivamente alla suddetta approvazione del progetto esecutivo:

- la norma di cui all'art. 1, comma 913, della legge 30.12.2018, n. 145, ha stabilito che le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase d'appalto o in corso d'opera, nonché quelle costituite da eventuali residui ulteriori di cui ai contributi di cui sopra rimangono acquisite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- la norma di cui all'art. 1, comma 916, della legge 30.12.2018, n. 145 ha stabilito che entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge stessa la Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli enti beneficiari "provvedono all'adeguamento delle convenzioni già sottoscritte alle disposizioni del comma 913";

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 127 del 05/03/2019 è stato approvato lo schema di "Convenzione di modifica della Convenzione del Comune di Padova" inviata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella quale – tra le altre modifiche - viene indicato che "le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto o incorso d'opera ... sono revocate e rimangono acquisite al Fondo sviluppo e coesione", mentre "nell'anno 2019 le erogazioni sono effettuate per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma";

RICHIAMATA inoltre la propria determinazione a contrattare 2018/57/0416 del 28/08/2018 con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta (artt. 36 c.2 lett. d e 60 del D. Lgs. 50/2016) e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016;

VISTI

- il verbale di gara in data 10/10/2018 del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato inerente le operazioni di apertura della Busta A "Documentazione Amministrativa" degli operatori economici che hanno fatto pervenire le proprie offerte;
- la determinazione n. 2018/57/0701 del 30/11/2018 con la quale si è provveduto a nominare, ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche, la Commissione giudicatrice per l'aggiudicazione dei lavori di che trattasi;

PRESO ATTO dei lavori della Commissione giudicatrice come da verbali in data 14/12/2018, 21/12/2018, 08/01/2019, 21/01/2019, dai quali risulta che la miglior offerta è quella del R.T.I. tra Zara Metalmeccanica Srl (mandataria) e Veronese Impianti Spa (mandante);

DATO atto che il responsabile del procedimento ha concluso con esito positivo la verifica sul rispetto di quanto stabilito dall'art. 97, c. 5, lettera d) D.Lgs. 50/2016 relativamente al costo della manodopera (cfr. nota agli atti prot. n. 212669 del 24/5/2019);

VISTO quanto sopra e il ribasso offerto del 10,66% si ritiene di aggiudicare i lavori in oggetto al R.T.I. tra Zara Metalmeccanica Srl (mandataria) e Veronese Impianti Spa (mandante) per l'importo di € 1.700.125,00 oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 10%, atteso che il ribasso offerto può considerarsi congruo;

RITENUTO di assestare, a seguito dell'affidamento, il quadro economico di progetto così come di seguito riportato:

	G.C. n. 299/2018	differenza	Affidamento
A) Lavori	€ 1.875.000,00	€ 199.875,00	€ 1.675.125,00
Oneri	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
Totale	€ 1.900.000,00	€ 199.875,00	€ 1.700.125,00
B) Somme a disposizione			
IVA 10% sui lavori	€ 190.000,00	€ 19.987,50	€ 170.012,50
Fondo accordi bonari	€ 57.000,00	€ 0,00	€ 57.000,00
Contributo ANAC	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
Imprevisti	€ 10.879,30	€ 0,00	€ 10.879,30
Oneri sottoservizi : per monitoraggio e analisi acque di falda	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
IVA per oneri sottoservizi	€ 4.400,00	€ 0,00	€ 4.400,00
Spese tecniche progettazione preliminare definitiva esecutiva	€ 37.175,84	€ 0,00	€ 37.175,84
inarcassa spese progettazione	€ 1.487,03	€ 0,00	€ 1.487,03
IVA su spese tecniche per progettazione	€ 8.505,83	€ 0,00	€ 8.505,83
Spese tecniche per D.L., assistenza, contabilità	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
inarcassa spese per D.L., assistenza, contabilità	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
IVA per spese per D.L., assistenza, contabilità	€ 5.720,00	€ 0,00	€ 5.720,00
Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
inarcassa per Coordinamento Sicurezza	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
IVA per Coordinamento Sicurezza	€ 3.432,00	€ 0,00	€ 3.432,00
Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016	€ 19.200,00	€ 0,00	€ 19.200,00
Totale somme a disposizione	€ 400.000,00	€ 19.987,50	€ 380.012,50
Totale complessivo	€ 2.300.000,00	€ 0,00	€ 2.080.137,50
Economie da ribasso	€ 0,00	-€ 219.862,50	€ 219.862,50

PRESO ATTO

- che le economie da ribasso risultano, comunque, finanziate all'interno del Quadro economico di progetto dai fondi propri messi a disposizione dall'Ente e, pertanto, possono essere riallocate così come di seguito riportato, fermo restando che ai fini del contributo ministeriale rimangono acquisite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

	G.C. n. 299/2018	differenza	Affidamento
A) Lavori	€ 1.875.000,00	€ 199.875,00	€ 1.675.125,00
Oneri	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
Totale	€ 1.900.000,00	€ 199.875,00	€ 1.700.125,00
B) Somme a disposizione			
IVA 10% sui lavori	€ 190.000,00	€ 19.987,50	€ 170.012,50
Fondo accordi bonari	€ 57.000,00	€ 0,00	€ 57.000,00
Contributo ANAC	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
Imprevisti	€ 10.879,30	€ 0,00	€ 10.879,30
Oneri sottoservizi : per monitoraggio e analisi acque di falda	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
IVA per oneri sottoservizi	€ 4.400,00	€ 0,00	€ 4.400,00
Spese tecniche progettazione preliminare definitiva esecutiva	€ 37.175,84	€ 0,00	€ 37.175,84
inarcassa spese progettazione	€ 1.487,03	€ 0,00	€ 1.487,03
IVA su spese tecniche per progettazione	€ 8.505,83	€ 0,00	€ 8.505,83
Spese tecniche per D.L., assistenza, contabilità	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
inarcassa spese per D.L., assistenza, contabilità	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00
IVA per spese per D.L., assistenza, contabilità	€ 5.720,00	€ 0,00	€ 5.720,00
Spese tecniche per Coordinamento Sicurezza	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00
inarcassa per Coordinamento Sicurezza	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
IVA per Coordinamento Sicurezza	€ 3.432,00	€ 0,00	€ 3.432,00
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 19.200,00	€ 0,00	€ 19.200,00
Totale somme a disposizione	€ 400.000,00	€ 19.987,50	€ 380.012,50
Economie da ribasso	€ 0,00	-€ 219.862,50	€ 219.862,50
Totale complessivo	€ 2.300.000,00	€ 0,00	€ 2.300.000,00

- della dichiarazione di subappalto;
- che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 102 e n. 103 del 22 dicembre 2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 nonché la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 dell'11 gennaio 2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. per gli esercizi 2019-2021;

VISTO

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;

- l'art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

1. DETERMINA

1. di approvare i verbali di gara di cui alle premesse, allegando al presente atto i verbali della Commissione giudicatrice;
2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra riportato, dando atto che ai sensi dell'art. 1 c. 913 della L. 145/2018 relativamente al contributo statale *"Le risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, nonché quelle costituite dagli eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti inseriti nel Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono revocate e rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri"*;
3. di aggiudicare l'appalto dei lavori in oggetto all R.T.I. tra Zara Metalmeccanica Srl (mandataria) e Veronese Impianti Spa (mandante) con sede della mandataria a Dolo (VE) – Codice Fiscale e P.IVA 03170620276 (cod. fornitore 26222) che ha offerto il ribasso del 10,66% e, quindi, per l'importo complessivo € 1.870.137,50, oneri e IVA 10% compresi;
4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 299/2018, le somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 19.200,00;
5. di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 205 D.lgs 50/2016), previsto nella deliberazione di G.C. n. 299/2018, ammonta a € 57.000,00;
6. di gravare la spesa complessiva di € 1.870.137,50, a favore del R.T.I. tra Zara Metalmeccanica Srl (mandataria) e Veronese Impianti Spa (mandante), come segue:
 - per € 1.404.838,63 sul cap. 22315100 "Riqualificazione area di Piazzale Boschetti" del Bilancio di previsione 2019-2021 – classificazione di bilancio U.01.06.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.999 impegno n. 2019/1090/0 (deliberazione di G.C. n. 299 del 05/06/2018 - G.C. n. 541/2016) (Vincolo 2016O003);
 - per € 465.298,90 sul cap. 22315105 "Riqualificazione area di Piazzale Boschetti" del Bilancio di previsione 2019-2021 – classificazione di bilancio U.01.06.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.999 impegno n. 2019/1091/0 (deliberazione di G.C. n. 299 del 05/06/2018 - G.C. n. 541/2016) (Vincolo 2016A004);
7. di gravare la somma di € 19.200,00, per l'accantonamento dell'incentivo per funzioni tecniche, sul cap. 22315105 "Riqualificazione area di Piazzale Boschetti" del Bilancio di previsione 2019-2021 – classificazione di bilancio U.01.06.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.999 impegno n. 2019/1091/0 (deliberazione di G.C. n. 299 del 05/06/2018 - G.C. n. 541/2016) (Vincolo 2016A004);
8. di gravare la somma di € 57.000,00 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22315105 "Riqualificazione area di Piazzale Boschetti" del Bilancio di previsione 2019-2021 – classificazione di bilancio U.01.06.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.999 impegno n. 2019/1091/0 (deliberazione di G.C. n. 299 del 05/06/2018 - G.C. n. 541/2016) (Vincolo 2016A004).

17/07/2019

Il Capo Settore ad interim
Massimo Benvenuti

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Prov.	Num. Def.
C	U.01.06.2.02	22315105	U.2.02.01.09.999	57.000,00	FONDO ACCORDI BONARI	201900294	2019000109103

2019/57/0557

C	U.01.06.2.02	22315100	U.2.02.01.09.999	1.404.838,63	ZARA METALMECCANICA SRL	201900294	2019000109004
C	U.01.06.2.02	22315105	U.2.02.01.09.999	19.200,00	GIRO CONTABILE TESORIERE COM.LE INTESA SAN PAOLO	201900294	2019000109102
C	U.01.06.2.02	22315105	U.2.02.01.09.999	465.298,87	ZARA METALMECCANICA SRL	201900294	2019000109101

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina.

18/07/2019

Il Funzionario con P.O. delegato
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

COMUNE DI PADOVA**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

Procedura aperta per l'appalto dei lavori di riqualificazione dell'area di Piazzale Boschetti – Parco urbano Boschetti tra via Trieste, via G. Gozzi, via Vecchio Gasometro e il canale Piovego”

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 7607926325.

CUP (Codice Unico Progetto) n. H91B15000560004.

CPV 445212600-2 Lavori di costruzione di padiglioni.

Codice Opera: LLPP EDP 2016/002.

VERBALE DI GARA**(Apertura della “busta B” contenente l’offerta tecnica)**

Il giorno 14 dicembre 2018, presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici in via N. Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al pubblico alle ore 8.30 presiede la seduta il sottoscritto ing. Paolo Salvagnini, Dirigente del Settore Lavori Pubblici – in qualità di presidente della commissione giudicatrice, con l’assistenza dell’ arch. Stefano Benvegnù funzionario con A.S. del Settore Lavori Pubblici e l’arch. Domenico Lo Bosco Funzionario del Settore Lavori Pubblici, in qualità di commissari e della dott.ssa Claudia Bettio, Istruttore contabile del Settore Lavori Pubblici in qualità di segretario.

Non è presente nessun rappresentante degli operatori economici ammessi alla gara.

PREMESSO

- che con determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 2018/57/0701 del 30/11/2018 è stata nominata la commissione giudicatrice;
- che in data 10/10/2018 il RUP, Geom. Marco Forese , ha approvato il verbale della seduta in data 10/10/2018 dichiarando la regolarità della documentazione presentata dai concorrenti relativamente alla verifica sulla regolarità della documentazione amministrativa prescritta dal disciplinare di gara
- che in data 12/12/2018 è stata comunicata ai concorrenti, attraverso l’invio di posta certificata, la data di apertura della busta “B – offerta tecnica”;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente dichiara aperta la seduta e prende atto che il plico contenente le offerte ammesse risulta essere correttamente conservato e sigillato così come trasmesso dal

Settore Contratti, Appalti e Provveditorato e conferma che gli operatori economici ammessi sono i seguenti:

1. R.T.I. tra Bortoletto Metal Construction Srl (mandataria) e Cosmo Ambiente Srl (mandante) e Cosmo Scavi Srl (mandante);
2. R.T.I. tra Zara Metalmeccanica Srl (mandataria) e Veronese Impianti Spa (mandante).

Il Presidente procede, pertanto alla verifica della regolarità della documentazione relativa alle proposte tecniche (sub elementi d), e), f), g) come prescritto dal disciplinare di gara.

A conclusione della fase di verifica viene dato atto che tutti i concorrenti hanno presentato regolarmente la documentazione prescritta.

Alle ore 8.43 viene chiusa la seduta pubblica. La commissione fissa la nuova data per la seduta riservata relativa alla valutazione delle proposte e all'attribuzione dei relativi punteggi per il giorno mercoledì 19 dicembre 2018 alle ore 14.30.

Il Presidente dispone che le buste "C" (Offerta economica) siano inserite in un plico, chiuso, sigillato e firmato sui lembi di chiusura dal sottoscritto Presidente di gara e dai commissari sopra indicati.

Il Presidente dispone, infine, che il suddetto involucro e la documentazione esaminata nella presente seduta, siano custoditi in un armadio chiuso a chiave presso il Settore Lavori Pubblici e che la chiave del predetto armadio sia custodita dal sottoscritto Presidente della presente seduta di gara.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente della Commissione, e previa lettura e conferma dai commissari.

Il Presidente ing. Paolo Salvagnini

.....

**Documento firmato da:
PAOLO SALVAGNINI
17/12/2018**

Il Commissario arch. Stefano Benvegnù

.....

**Documento firmato da:
BENVEGNI STEFANO
COMUNE DI PADOVA
17/12/2018**

Il Commissario arch. Domenico Lo Bosco

.....

**Documento firmato da:
DOMENICO SALVATORE
LO BOSCO
COMUNE DI**

COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Procedura aperta per l'appalto dei lavori di riqualificazione dell'area di Piazzale Boschetti – Parco urbano Boschetti tra via Trieste, via G. Gozzi, via Vecchio Gasometro e il canale Piovego”

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 7607926325.

CUP (Codice Unico Progetto) n. H91B15000560004.

CPV 445212600-2 Lavori di costruzione di padiglioni.

Codice Opera: LLPP EDP 2016/002.

VERBALE DI GARA N.2

Il giorno 21.12.2018 alle ore 9.00, presso la Sala riunioni del Settore Lavori Pubblici 11° piano, in Via N. Tommaseo n. 60, si è riunita la Commissione, nominata con determinazione n. 2018/57/0701 del 30.11.2018 e composta da:

Ing. Paolo Salvagnini, dirigente Settore LL.PP., in qualità di Presidente
Arch. Stefano Benvegnù, funzionario con PO, in qualità di Componente
Arch. Domenico Lo Bosco, funzionario con PO, in qualità di Componente
Dott.ssa Claudia Bettio, istruttore contabile, in qualità di Segretario verbalizzante;

PREMESSO


- che con determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 2018/57/0701 del 30/11/2018 è stata nominata la commissione giudicatrice;
- - che in data 10/10/2018 il RUP, Geom. Marco Forese , ha approvato il verbale della seduta nel quale si dichiarava la regolarità della documentazione presentata dai concorrenti relativamente alla verifica sulla regolarità della documentazione amministrativa prescritta dal disciplinare di gara;
- che in data 12/12/2018 è stata comunicata ai concorrenti, attraverso l'invio di posta certificata, la data di apertura della busta “B – offerta tecnica”;
- che in data 14/12/2018 si è proceduto alla verifica della regolarità della documentazione relativa alle proposte tecniche dando atto che i due concorrenti:
R.T.I. tra Bortoletto Metal Construction Srl (mandataria) e Cosmo Ambiente Srl (mandante) e Cosmo Scavi Srl (mandante) e,
R.T.I. tra Zara Metalmeccanica Srl (mandataria) e Veronese Impianti Spa (mandante).

hanno presentato regolarmente la documentazione prescritta;

- Alle ore 8.43 la seduta si è conclusa ed è stata fissata una nuova data per la valutazione delle proposte e all'attribuzione dei relativi punteggi del materiale relativo alla proposta tecnica per il giorno 19/12/2018 alle ore 14.30;
- la seduta riservata del 19.12.2018 è stata rinviata, causa impegni della Commissione, al giorno 21/12/2018 alle ore 9.00,
- la Commissione riunitasi in seduta riservata il giorno 21/12/2018 alle ore 9.00 ha sospeso i lavori alle ore 12.08, riaggiornando l'analisi della documentazione a martedì 8 gennaio 2019 alle ore 15.00.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente di gara e dai Commissari.


Il Presidente ing. Paolo Salvagnini



21.12.2018


Documento firmato da:
PAOLO SALVAGNINI
30/01/2019


Il Commissario arch. Stefano Benvegnù

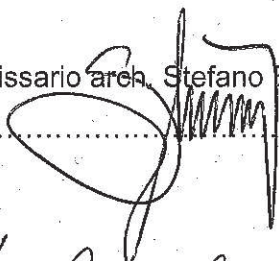

21/12/2018


Documento firmato da:
BENVEGNÙ STEFANO
COMUNE DI PADOVA
30/01/2019

Il Commissario arch. Domenico Lo Bosco



21.12.2018


Documento firmato da:
DOMENICO SALVATORE
LO BOSCO
COMUNE DI

COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Procedura aperta per l'appalto dei lavori di riqualificazione dell'area di Piazzale Boschetti – Parco urbano Boschetti tra via Trieste, via G. Gozzi, via Vecchio Gasometro e il canale Piovego”

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 7607926325.

CUP (Codice Unico Progetto) n. H91B15000560004.

CPV 445212600-2 Lavori di costruzione di padiglioni.

Codice Opera: LLPP EDP 2016/002.

VERBALE DI GARA N.3

Il giorno 08.01.2019 alle ore 15.00, presso la Sala riunioni del Settore Lavori Pubblici 11° piano, in Via N. Tommaseo n. 60, si è riunita la Commissione, nominata con determinazione n. 2018/57/0701 del 30.11.2018 e composta da:

Ing. Paolo Salvagnini, dirigente Settore LL.PP., in qualità di Presidente

Arch. Stefano Benvegnù, funzionario con PO, in qualità di Componente

Arch. Domenico Lo Bosco; funzionario con PO, in qualità di Componente

Dott.ssa Claudia Bettio, istruttore contabile, in qualità di Segretario verbalizzante;

PREMESSO

- che con determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 2018/57/0701 del 30/11/2018 è stata nominata la commissione giudicatrice;
- - che in data 10/10/2018 il RUP, Geom. Marco Forese , ha approvato il verbale della seduta nel quale si dichiarava la regolarità della documentazione presentata dai concorrenti relativamente alla verifica sulla regolarità della documentazione amministrativa prescritta dal disciplinare di gara;
- che in data 12/12/2018 è stata comunicata ai concorrenti, attraverso l'invio di posta certificata, la data di apertura della busta “B – offerta tecnica”;
- che in data 14/12/2018 si è proceduto alla verifica della regolarità della documentazione relativa alle proposte tecniche dando atto che i due concorrenti:
R.T.I. tra Bortoletto Metal Construction Srl (mandataria) e Cosmo Ambiente Srl (mandante)
e Cosmo Scavi Srl (mandante) e,
R.T.I. tra Zara Metalmeccanica Srl (mandataria) e Veronese Impianti Spa (mandante).

hanno presentato regolarmente la documentazione prescritta;

- che in data 21/12/2018 alle ore 9.00 la Commissione si è riunita in seduta riservata per la valutazione delle proposte riaggiornando l'analisi della documentazione al giorno 08.01.2019;
- la Commissione riunitasi in seduta riservata il giorno 08.01.2019 alle ore 15.00 ha ripreso i lavori relativi all'analisi della documentazione.

Conclusa la valutazione delle proposte tecniche e l'attribuzione dei relativi punteggi come riportato negli allegati "e)"(valutazione personale) e "d)f)g)"(fasi di valutazione) che formano parte integrante del presente verbale; le ditte ammesse alla fase successiva risultano pertanto:

R.T.I. tra Bortoletto Metal Construction Srl (mandataria) e Cosmo Ambiente Srl (mandante) e Cosmo Scavi Srl (mandante);

- R.T.I. tra Zara Metalmeccanica Srl (mandataria) e Veronese Impianti Spa (mandante)

il Presidente della Commissione dichiara la chiusura dei lavori alle ore 15.30 e aggiorna la seduta, per l'apertura della busta contenente l'offerta economica al giorno 21.01.2019 alle ore 11.00.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente della Commissione, e previa lettura e conferma dai commissari.

Il Presidente ing. Paolo Salvagnini

.....


Documento firmato da:
PAOLO SALVAGNINI
21/01/2019

Il Commissario arch. Stefano Benvegnù

.....


Documento firmato da:
BENVEGNI STEFANO
COMUNE DI PADOVA
21/01/2019

Il Commissario arch. Domenico Lo Bosco

.....


Documento firmato da:
DOMENICO SALVATORE
LO BOSCO
COMUNE DI

OGGETTO: Riqualificazione dell’area di Piazzale Boschetti

CIG 7607926325

MAX	0,500	punti
MIN	0,333	10,000

MAX	0,333	punti
MIN	0,000	10,000

MAX	0,533	punti
MIN	0,267	10,000

d) f) g) FASI DI VALUTAZIONE

ordine apertura buste	CONCORRENTI	d) FASI DI LAVORAZIONE			media	punteggio	f) TIPO CONGLOMERATO			media	punteggio	G) TRATTAMENTI PROTETTIVI			media	punteggio	SOMMA PUNTEGGIO
		COMMISSARIO 1 SALVAGNINI	COMMISSARIO 2 BENVEGNUM	COMMISSARIO 3 LO BOSCO			COMMISSARIO 1 SALVAGNINI	COMMISSARIO 2 BENVEGNUM	COMMISSARIO 3 LO BOSCO			COMMISSARIO 1 SALVAGNINI	COMMISSARIO 2 BENVEGNUM	COMMISSARIO 3 LO BOSCO			
1	R.T.I. BORTOLETTO – COSMO	0,200	0,500	0,300	0,333	6,667	0,400	0,300	0,300	0,333	10,000	0,200	0,300	0,300	0,267	5,000	21,667
2	R.T.I. ZARA – VERONESE	0,300	0,700	0,500	0,500	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,500	0,600	0,500	0,533	10,000	20,000

OGGETTO: Riqualificazione dell’area di Piazzale Boschetti

CIG 7607926325

MAX	0,767	punti
MIN	0,267	2,000

MAX	0,600	punti
MIN	0,267	3,000

MAX	0,567	punti
MIN	0,267	2,000

MAX	0,767	punti
MIN	0,267	3,000

e) VALUTAZIONE PERSONALE

ordine apertura buste	CONCORRENTI	e I) : Gestione ambientale			media	punteggio	e II): Gestione delle polveri			media	punteggio	e III) Gestione delle acque			media	punteggio	e IV) : Gestione dei rifiuti			media	punteggio	SOMMA PUNTEGGIO
		COMMISSARIO 1 SALVAGNINI	COMMISSARIO 2 BENVEGNU	COMMISSARIO 3 LO BOSCO			COMMISSARIO 1 SALVAGNINI	COMMISSARIO 2 BENVEGNU	COMMISSARIO 3 LO BOSCO			COMMISSARIO 1 SALVAGNINI	COMMISSARIO 2 BENVEGNU	COMMISSARIO 3 LO BOSCO			COMMISSARIO 1 SALVAGNINI	COMMISSARIO 2 BENVEGNU	COMMISSARIO 3 LO BOSCO			
1	R.T.I. BORTOLETTO – COSMO	0,800	0,700	0,800	0,767	2,000	0,600	0,600	0,600	0,600	3,000	0,500	0,600	0,600	0,567	2,000	0,800	0,700	0,800	0,767	3,000	10,000
2	R.T.I. ZARA – VERONESE	0,200	0,300	0,300	0,267	0,696	0,200	0,300	0,300	0,267	1,333	0,200	0,300	0,300	0,267	0,941	0,200	0,300	0,300	0,267	1,043	4,014

COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Procedura aperta per l'appalto dei lavori di riqualificazione dell'area di Piazzale Boschetti – Parco urbano Boschetti tra via Trieste, via G. Gozzi, via Vecchio Gasometro e il canale Piovego”

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 7607926325.

CUP (Codice Unico Progetto) n. H91B15000560004.

CPV 445212600-2 Lavori di costruzione di padiglioni.

Codice Opera: LLPP EDP 2016/002.

VERBALE DI GARA N.4

(Apertura della busta contenente l'offerta economica)

Il giorno 21.01.2019 in luogo aperto al pubblico alle ore 11.00 presso la Sala riunioni del Settore Lavori Pubblici 11° piano, in Via N. Tommaseo n. 60, si è riunita la Commissione presieduta dall' Ing. Paolo Salvagnini, dirigente Settore LL.PP., in qualità di Presidente
Arch. Stefano Benvegnù, funzionario con PO, in qualità di Componente
Arch. Domenico Lo Bosco; funzionario con PO, in qualità di Componente
Dott.ssa Claudia Bettio, istruttore contabile, in qualità di segretario verbalizzante;

PREMESSO

- che con determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 2018/57/0701 del 30/11/2018 è stata nominata la commissione giudicatrice;
- in data 17.01.2019 è stata comunicata ai concorrenti, attraverso l'invio di posta certificata, la data di apertura della busta “C – offerta economica e altri elementi quantitativi”;

Il Presidente prosegue con l'apertura dei plichi dando lettura delle offerte presentate dagli operatori economici concorrenti e dei relativi punteggi

TUTTO CIO' PREMESSO

Il Presidente dichiara aperta la seduta, da lettura del verbale N.3, dei relativi allegati e procede all'apertura della busta C fatta pervenire nella propria offerta, dai seguenti operatori economici:

R.T.I. tra Bortoletto Metal Construction Srl (mandataria) e Cosmo Ambiente Srl (mandante) e Cosmo Scavi Srl (mandante);

R.T.I. tra Zara Metalmeccanica Srl (mandataria) e Veronese Impianti Spa (mandante).

E' presente il Signor Matteo Ruvoletto (impiegato) in rappresentanza R.T.I. tra Zara Metalmeccanica Srl e Veronese Impianti Spa., giusta delega del prot.29132 del 21/01/2019. Alle ore 11.15 il Presidente procede, pertanto, all' apertura e verifica della busta "C" (offerta economica) .

Alle ore 11.30, viene provvisoriamente aggiudicato al R.T.I. tra Zara Metalmeccanica Srl (mandataria) e Veronese Impianti Spa (mandante) secondo il tabulato allegato, parte integrante di questo verbale.

il Presidente della Commissione dichiara la chiusura dei lavori alle ore 11.40 .

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto dal Presidente della Commissione, e previa lettura e conferma dai commissari.

Il Presidente ing. Paolo Salvagnini

.....


Documento firmato da:
PAOLO SALVAGNINI
28/01/2019

Il Commissario arch. Stefano Benvegnù

.....


Documento firmato da:
BENVEGNUM STEFANO
COMUNE DI PADOVA
30/01/2019

Il Commissario arch. Domenico Lo Bosco

.....


Documento firmato da:
DOMENICO SALVATORE
LO BOSCO
COMUNE DI

A – CRITERI QUANTITATIVI VALUTATI IN MODO “AUTOMATICO”

			valore massimo		punteggio massimo		VALORE 4/5	
			10,660		30		24	
ORDINE APERTURA BUSTE	DITTA	LA DITTA E' PRESENTE ALL' APERTURA ? SI/NO	OFFERTA ECONOMICA MAX PUNTI 30/100				SE IL PUNTEGGIO è MAGGIORE O UGUALE AI 4/5 DEL PUNTEGGIO MASSIMO L'OFFERTA è ANOMALA	
			PREZZO OFFERTO	RIBASSO OFFERTO	PUNTEGGIO PROVVISORIO	PUNTEGGIO DEFINITIVO		
1	R.T.I. BORTOLETTO – COSMO		,00	3,565	0,334	10,033	OK	
2	R.T.I. ZARA – VERONESE		,00	10,660	1,000	30,000	ANOMALA	

4/5 DEL VALORE MASSIMO DEL TOTALE (64+6)=70	56
MAX PUNTEGGIO COMPLESS	61,667

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

CHIEDE DI AGGIORNARE ? > SI

ORDINE APERTURA BUSTE	DITTA	TOTALE PUNTEGGI				TOTALE COMPLESSIVO	ANOMALA??
		CERTIFICAZIONI	FASI LAVORAZIONE	VALUTAZIONE PERSONALI	PUNTEGGIO GIORNI	PUNTEGGIO	
1	R.T.I. BORTOLETTO – COSMO	10	21,667	10,000	20,000	61,667	ANOMALA
2	R.T.I. ZARA – VERONESE	10	20,000	4,014	17,284	51,298	OK

 Documento firmato da:
DOMENICO SALVATORE
LO BOSCO
COMUNE DI

 Documento firmato da:
BENVEGNI STEFANO
COMUNE DI PADOVA
30/01/2019

 Documento firmato da:
PAOLO SALVAGNINI
28/01/2019

RIEPILOGO PUNTEGGIO COMPLESSIVO

CHIEDE DI AGGIORNARE ? > SI

ORDINE APERTURA BUSTE	DITTA	RIEPILOGO TOTALE PUNTEGGI				TOTALE COMPLESSIVO
		OFFERTA ECONOMICA	ANOMALA?	CERTIFICAZIONI + FASI LAVORAZIONE+ VALUTAZ PERSONALI + PUNTEGGIO GIORNI +	ANOMALA?	TOTALE
1	R.T.I. BORTOLETTO – COSMO	10,033	OK	61,667	OK	71,699
2	R.T.I. ZARA – VERONESE	30,000	ANOMALA	51,298	OK	81,298


Documento firmato da:
DOMENICO SALVATORE
LO BOSCO
COMUNE DI


Documento firmato da:
BENVEGNI STEFANO
COMUNE DI PADOVA
30/01/2019


Documento firmato da:
PAOLO SALVAGNINI
28/01/2019
